


VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI.

- 1.Būvlaukums organizējams esošajā ēkas pagalmā;
- 2.Piebraukšana būvlaukumam paredzēta no Stacijas ielas;
- 3.Būvniecības darbu nodrošināšana ar elektroenerģiju un ūdeni no esošajiem tīkliem, par pieslēguma vietām vienoties ar būvobjekta īpašnieku;
- 4.Pirms darbu uzsākšanas izbūvēt nojumes virs ieejas durvīm un elektrības sadalnēm;
- 5.Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta;
- 6.Slodzes uz piebraucamajiem ceļiem un būvmateriālu glabāšanas vietās nedrīkst pārsniegt 10 kN/m², bet tiešā ēkas tuvumā (2 m attālumā no ēkas fasādes) slodze uz pamatni nedrīkst pārsniegt 4 kN/m², savukārt kabeļu aizsargjoslā palīgēku, būvmateriālu un citu smagumu novietošana aizliegta;
- 7.Pagaidu nožogojuma augstums 1.8 m, no saliekamiem žogu posmiem;
- 8.Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā DVP.
- 9.Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu, jāuzstāda brīdinājuma un rīkojuma zīmes;
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakārtošanu;
11. Konteinera tipa vagoniņu izvietojums dots orientējošs, tas precizējams būvvietā;
12. Būvtāfeles izmērs ne mazāks kā A1 lapas formāta izmērs, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi;
13. Būvlaukumā atrasties tikai piederīgām personām, kuras izgājušas darba drošības instruktāžu un ir oficiāli reģistrēšas savas darba attiecības;
14. Kategoriski aizliegts atrasties objektā cilvēkiem, kuri atrodas alkohola reibumā, psihotropo vielu ietekmē vai citu elementu iespaidā;
15. Strādniekiem atrodoties būvlaukumā jāvalkā darba drošības apģērbs un darba apavi. Veicot darbus darbiniekiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
16. Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem paceltās konstrukcijas. Nodarbinātos no krītošiem preikšmetiem aizsargāt ar uztveršanas metodēm (aizsargtīkliem, nosegtām ejām);
17. Būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamam pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai un iespējai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Par traumām un savainojumiem informēt darbu vadītāju.
18. Pamatu atrakšanas darbi veicami ar rokām, nepielietojot mehānizētus rakšanas veidus;
- 19.Vecot atjaunošanas darbus kāpņu telpas vējtverī, ēkas iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt patstāvīgu izklūšanu/iekļūšanu ēkā. Veidot laipas un pakāpienus augstuma starpību pārveršanai.
20. Vienu dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA „Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzrādīšanai. Veikt pieteikumu e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>.
21. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tet" un "BITE Latvija" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
22. Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeļi, kas nav norādīts dokumentācijā, darbi pārtraucami, nodrošināma kabeļa saglabāšana, izsaucami elektrotīklu pārstāvji. Ja kabelis sarauts, jāinformē tīklu īpašnieks un jāorganizē līnijas remonts;
20. Būvdarbus veikt, nodrošinot AS "Sadales tīkls" pārstāvju brīvu piekļuvi pie elektropārvaldes komunikācijām jebkurā diennakts laikā. AS "Sadales tīkls" pārstāvjiem ieeju objektā nodrošināt caur mobilā pagaidu nožogojuma vārtiņiem;
- 21.Nepieciešamības gadījumā esošos elektroapgādes kabeļu ievadus ēkā jāparedz iečaulot dalāmajās aizsargcaurulēs DN110 mm, 750N.
22. **Pagaidu ēkas, būvmateriāla novietnes u.c. objektus paredzēt ārpus AS "Sadales tīkls" kabeļlīniju aizsargjoslām.**
23. Pirms darbu uzsākšanas piaicināt SIA „BITE Latvija” uzraudzības pārstāvi un veikt esošā sakaru tīkla, tīkla elementu apsekošanu dabā, saglabāšanas, aizsardzības iespējas un ar to saistītos tehniskos ,darba veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu pārstāvja klātbūtnē.
24. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt BITE Latvija pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv).
25. Būvdarbu laikā paredzēt esošo BITE Latvija tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar BITE Latvija pārstāvi).
26. Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta BITE Latvija PEST aizsardzība un droša eskpluatācija Objekta izbūves laikā. DVP obligāti saskaņot ar BITE Latvija.
27. Bite infrastruktūras elementu remonta/maināas gadījumā iesniegt objekta Pasūtītāja/Īpašnieka parakstītu apliecinājumu (veidlapa pieteikt network@bite.lv) un shēmu par būvprojekta ietvaros veikto SIA “BITE Latvija” elektronisko sakaru infrastruktūras remonta darbu izpildi.
28. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt BITE Latvija speciālistu (e-pasts: network@bite.lv).
29. Kabeļus, kuri nepieder BITE Latvija, AIZLIEGTS stiprināt pie Bite jumta statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar BITE Latvija.
30. 20 darbu dienu laikā pirms darbu veikšanas izsaukt SIA „TET” pārstāvi (e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>). 10 darbu dienu laikā pirms darbu veikšanas izņemt SIA „TET” darba veikšanas atļauju.

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

1:500

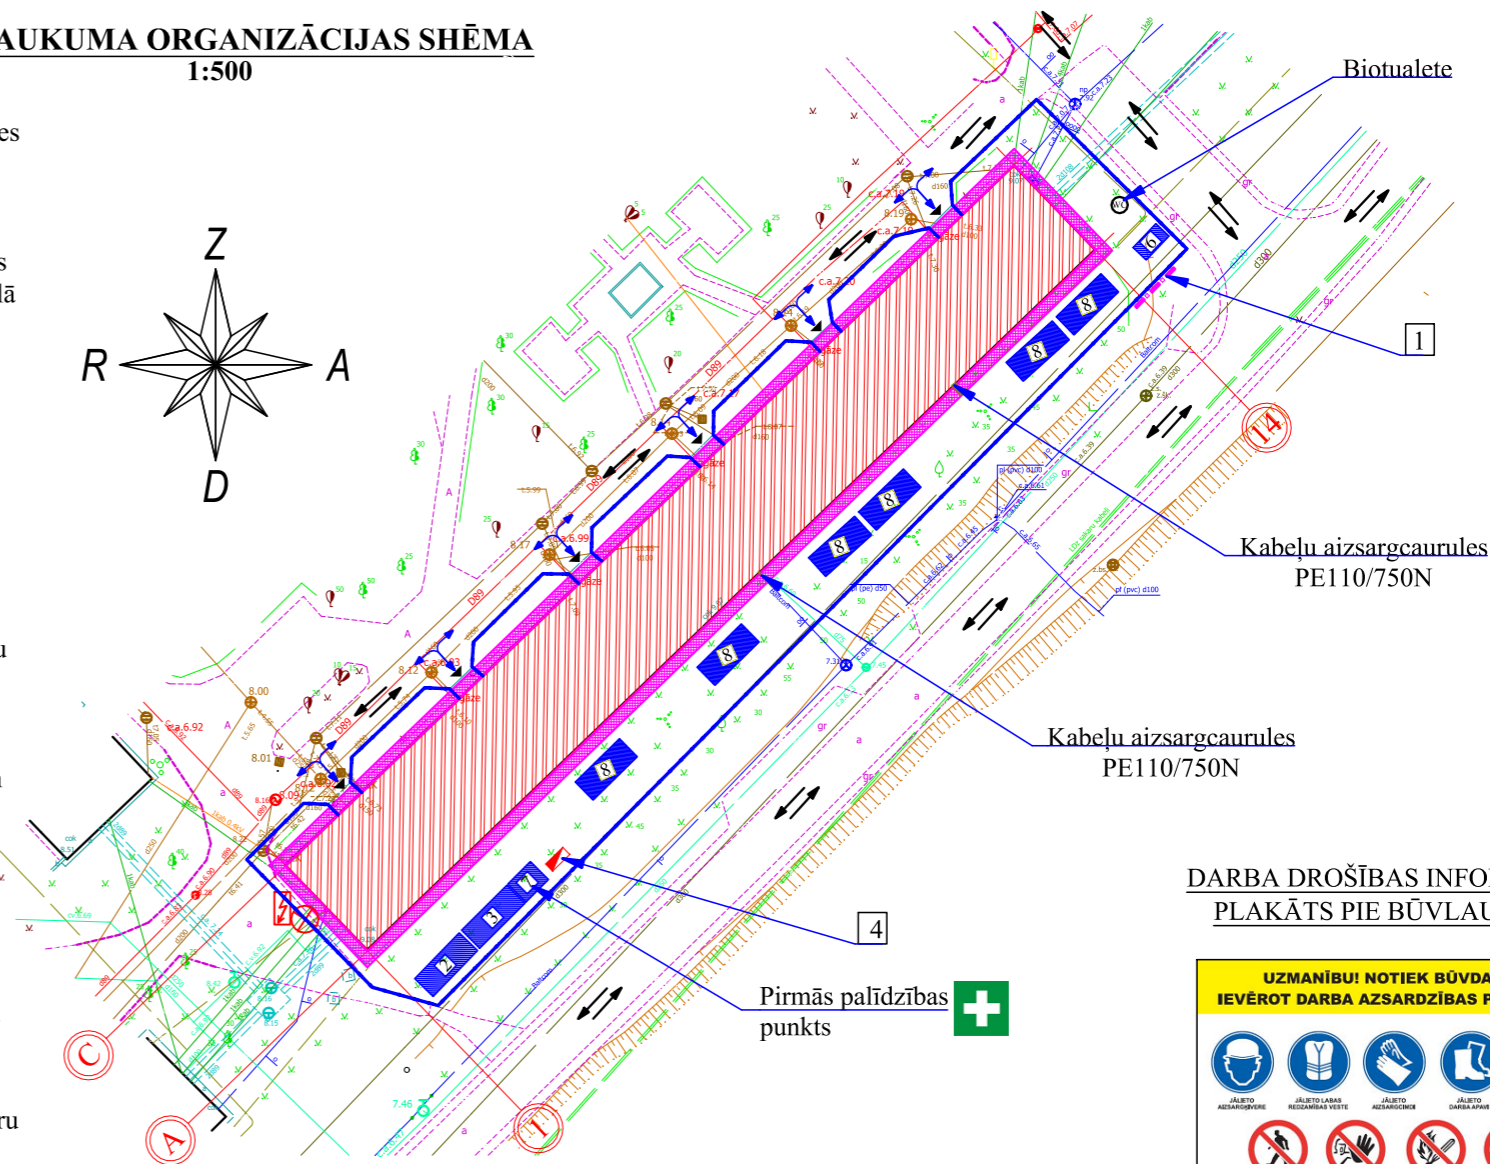

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

Esošā atjaunojamā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	
Autotransporta kustības virziens	
Gājēju kustības virziens	
Būvlaukuma nožogojums, h=1.8 m	
Esošās ieejas ēkā	
Projektētais sastatņu izvietojums. Sastatnes b-1.1m, 0.3m attālumā no fasādes	
Pirmās palīdzības punkts	
Pagaidu ūdens pieslēguma vieta	
Pagaidu elektrības pieslēguma vieta	
Būvtāfele	
Strādājošo sadzīves telpas	
Slēgta noliktava	
Ugunsdzēsības inventāra stends	
Biotualete	
Būvgрузu konteineris	
Darbu vadītāja ofiss	
Materiālu nokrautnes laukumi	

DARBA DROŠĪBAS INFORMĀTĪVS
PLAKĀTS PIE BŪVLAUKUMA



B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", reg.Nr. 50003182001, kūdras iela 27, Olaine, LV-2114		PASŪTIJUMA NR.: 1-24A/19	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI STACIJAS IELĀ 18, OLAINĒ, OLAINES NOV.		FAILA NOS.: analogs rasējuma Nr.	
OBJEKTA ADRESE: STACIJAS IELA 18, OLAINĒ, OLAINES NOV. KADASTRA NR. 8009 002 0626 001		ARHĪVA NR.: -	
RASĒJUMA NOSAUKUMS: BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA		STADIJA: PASKAIDROJUMA RAKSTS	
DAĻAS VAD.: IZSTRĀDĀJA:		DATUMS: 06.12.2024	
V.ČAIKOVA T.BERNERS		MEROGS: 1:100	
06.12.2024 06.12.2024		DAĻA RAS. NR.	LAPAS NR.
		DOP-02	
