



VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI.

- 1.Būvlaukums organizējams esošajā ēkas pagalmā;
- 2.Piebraukšana būvlaukumam paredzēta no Zemgales ielas;
- 3.Būvniecības darbu nodrošināšana ar elektroenerģiju un ūdeni no esošajiem tīkliem, par pieslēguma vietām vienoties ar būvobjekta īpašnieku;
- 4.Pirms darbu uzsākšanas izbūvēt nojumes virs ieejas durvīm un elektrības sadalnēm;
- 5.Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta;
- 6.Slodzes uz piebraucamajiem ceļiem un būvmateriālu glabāšanas vietās nedrīkst pārsniegts 10 kN/m², bet tiešā ēkas tuvumā (2 m attālumā no ēkas fasādes) slodze uz pamatni nedrīkst pārsniegts 4 kN/m², savukārt kabeļu aizsargjoslā palīgēku, būvmateriālu un citu smagumu novietošana aizliegta;
- 7.Pagaidu nožogojuma augstums 1.8 m, no saliekamiem žogu posmiem;
- 8.Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā DVP.
- 9.Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu, jāuzstāda brīdinājuma un rīkojuma zīmes;
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakārtošanu;
11. Konteinera tipa vagoniņu izvietojums dots orientējošs, tas precizējams būvvietā;
12. Būvtafeles izmērs ne mazāks kā A1 lapas formāta izmērs, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi;
13. Būvlaukumā atrasties tikai piederīgām personām, kuras izgājušas darba drošības instruktāžu un ir oficiāli reģistrēšas savas darba attiecības;
14. Kategoriski aizliegts atrasties objektā cilvēkiem, kuri atrodas alkohola reibumā, psihotropo vielu ietekmē vai citu elementu iespaidā;
15. Strādniekiem atrodoties būvlaukumā jāvalkā darba drošības apģērbs un darba apavi. Veicot darbus darbiniekiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
16. Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem paceltās konstrukcijas. Nodarbinātos no krītošiem preikšmetiem aizsargāt ar uztveršanas metodēm (aizsargtīkliem, nosegtām ejām);
17. Būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamam pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai un iespējai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Par traumām un savainojumiem informēt darbu vadītāju.
18. Pamatu atrakšanas darbi veicami ar rokām, nepielietojot mehānizētus rakšanas veidus;
19. Vecot atjaunošanas darbus kāpņu telpas vējtverī, ēkas iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt patstāvīgu izkļūšanu/iekļūšanu ēkā. Veidot laipas un pakāpienus augstuma starpību pārverēšanai.
20. Vienu dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA „Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzrādīšanai. Veikt pieteikumu e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>.
21. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tet" un "Baltcom" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
22. Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeli, kas nav norādīts dokumentācijā, darbi pārtraucami, nodrošināma kabeļa saglabāšana, izsaucami elektrotīklu pārstāvji. Ja kabelis sarauts, jāinformē tīklu īpašnieks un jāorganizē līnijas remonts;
20. Būvdarbus veikt, nodrošinot AS "Sadales tīkls" pārstāvju brīvu piekļuvi pie elektropārvaldes komunikācijām jebkurā diennakts laikā. AS "Sadales tīkls" pārstāvjiem ieeju objektā nodrošināt caur mobilā pagaidu nožogojuma vārtiņiem;
- 21.Nepieciešamības gadījumā esošos elektroapgādes kabeļu ievadus ēkā jāparedz iečaulot dalāmajās aizsargcaurulēs DN110 mm, 750N.
22. **Pagaidu ēkas, būvmateriāla novietnes u.c. objektus paredzēt ārpus AS "Sadales tīkls" kabeļlīniju aizsargjoslām.**
23. Pirms darbu uzsākšanas piaicināt SIA „BITE Latvija" uzraudzības pārstāvi un veikt esošā sakaru tīkla, tīkla elementu apsekošanu dabā, saglabāšanas, aizsardzības iespējas un ar to saistītos tehniskos ,darba veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu pārstāvja klātbūtnē.
24. 20 darba dienas pirms būvdarbu sākuma izņemt darba veikšanas atļauju un izsaukt BITE Latvija pārstāvi (e-pasts: network@bite.lv).
25. Būvdarbu laikā paredzēt esošo Bite tīkla infrastruktūras saglabāšanu un aizsardzību (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar Bite pārstāvi).
26. Objekta DVP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta BITE Latvija PEST aizsardzība un droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā. DVP obligāti saskaņot ar Bite.
27. Bite infrastruktūras elementu remonta/mainas gadījumā iesniegt objekta Pasūtītāja/Īpašnieka parakstītu apliecinājumu (veidlapa pieteikt network@bite.lv) un shēmu par būvprojekta ietvaros veikto SIA “Bite” elektronisko sakaru infrastruktūras remonta darbu izpildi.
28. Elektronisko sakaru tīkla remonta darbu veikšanai pieaicināt Bite speciālistu (e-pasts: network@bite.lv).
29. Kabeļus, kuri nepieder Bite, AIZLIEGTS stiprināt pie Bite jumta statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu noslēgšanas ar Baltcom.
30. 20 darbu dienu laikā pirms darbu veikšanas izsaukt SIA „TET" pārstāvi (e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>). 10 darbu dienu laikā pirms darbu veikšanas izņemt SIA „TET" darba veikšanas atļauju.

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

1:500

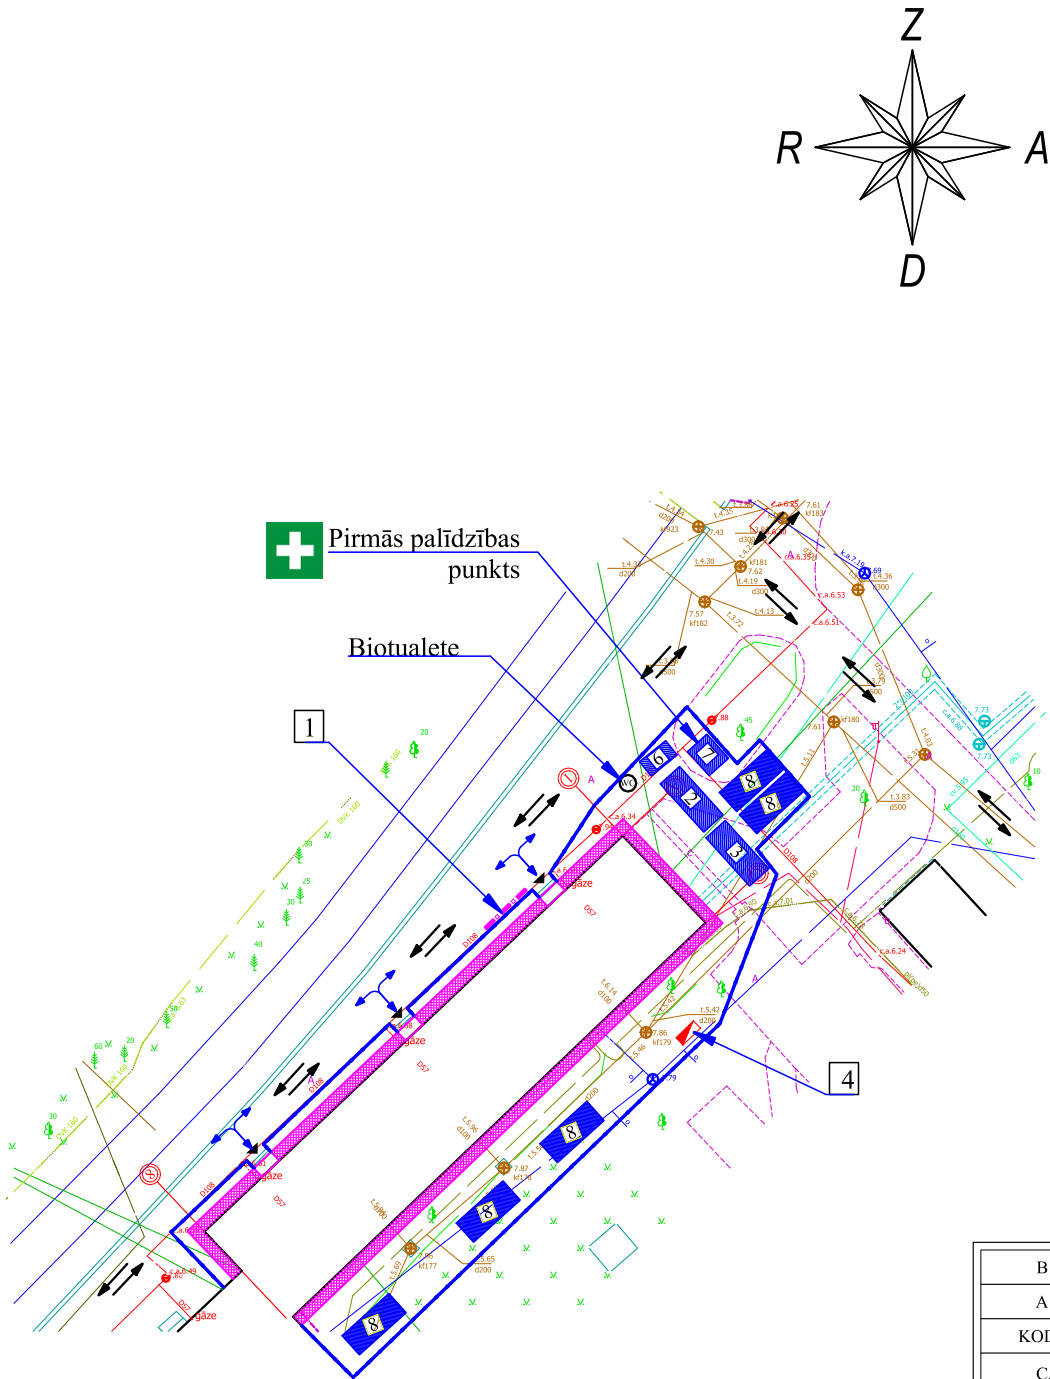

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

Esošā atjaunojamā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	
Autotransporta kustības virziens	
Gājēju kustības virziens	
Būvlaukuma nožogojums, h=1.8 m	
Esošās ieejas ēkā	
Projektētais sastatņu izvietojums. Sastatnes b-1.1m, 0.3m attālumā no fasādes	
Pirmās palīdzības punkts	
Pagaidu ūdens pieslēguma vieta	
Pagaidu elektrības pieslēguma vieta	
Būvtafele	
Strādājošo sadzīves telpas	
Slēgta noliktava	
Ugunsdzēsības inventāra stends	
Biotualete	
Būvgrozu konteineris	
Darbu vadītāja ofiss	
Materiālu nokrautnes laukumi	

DARBA DROŠĪBAS INFORMĀTĪVS
PLAKĀTS PIE BŪVLAUKUMA



B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJĒKTĒTĀJS: <div> Reģ. Nr. 40203172292, Zīrņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001</div>			
BŪVNICĪBAS ĪEROSINĀTĀJS: <div>AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REG. NR. 50003182001, KŪRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114</div>		PASŪTIJUMA NR.: <div>1-24A/20</div>	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: <div>ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ</div>		FAILA NOS.: <div>analoģs rasējuma Nr.</div> <div>ARHĪVA NR.:<div>-</div></div>	
OBJEKTA ADRESE: <div>ZEMGALES IELA 22, OLAINĒ, LV-2114 KADAŠTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0717 001</div>		STADIJA: <div>PASKAIDROJUMA RAKSTS</div>	
RASĒJUMA NOSAUKUMS: <div>BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA</div>		DATUMS: <div>22.10.2024</div>	
		MEROGS: <div>1:500</div>	
DAĻAS VAD.:	V.ČAIKOVA		22.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	O.OSADČUKA		22.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	T.BERNERS		22.10.2024
DAĻA	RAS. NR.	LAPAS NR.	
		DOP-02	
