

Z

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS PLĀNS
M 1:500

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

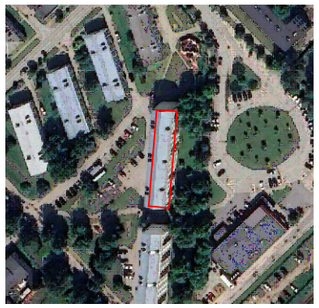

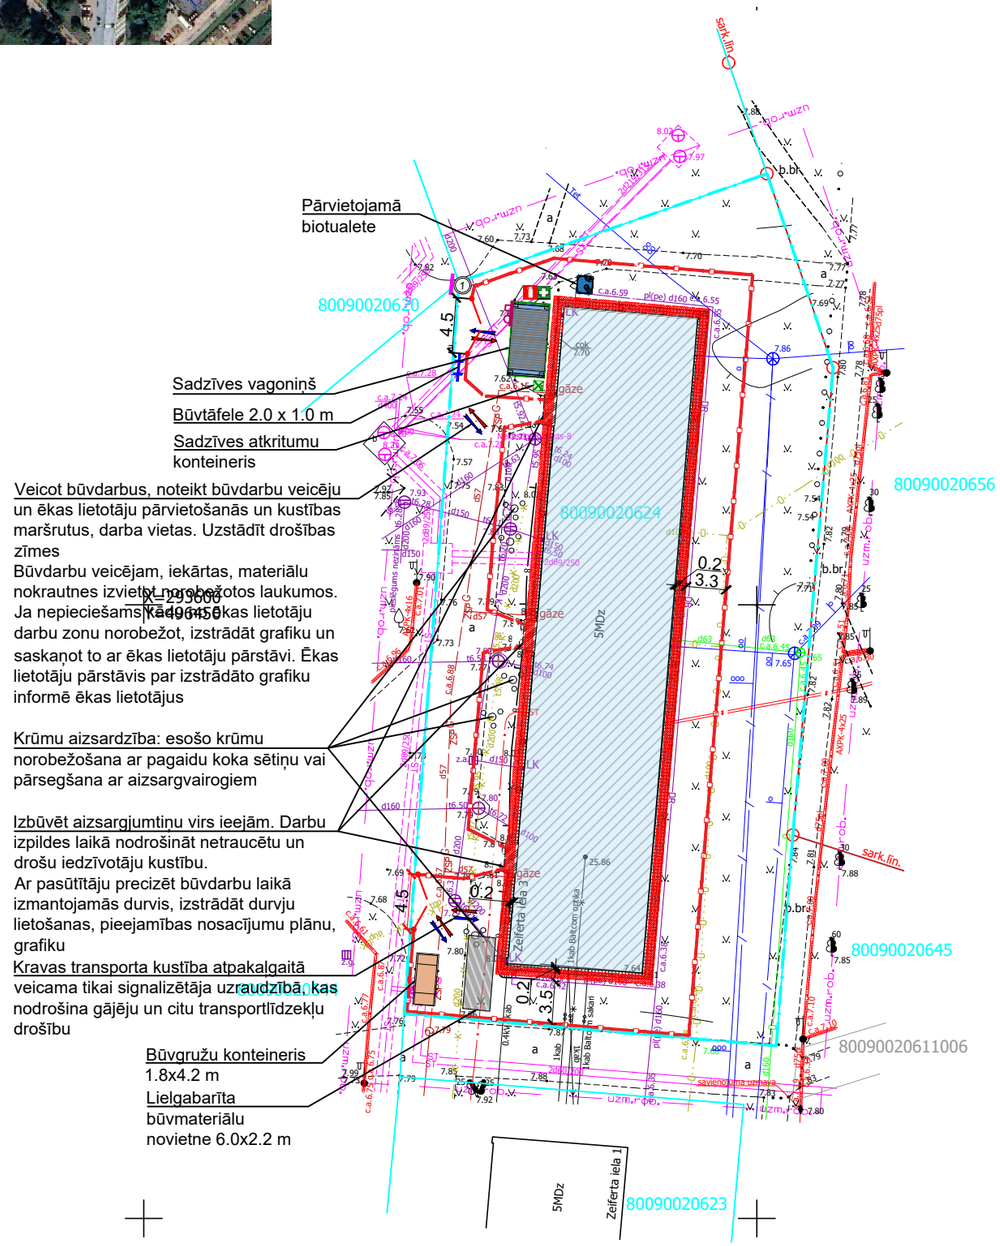

PIEZĪMES:

1. Pirms būvniecības uzsākšanas būvniekam atbilstoši darbu organizācijas projektam (DOP) izstrādāt un saskaņot „Darbu veikšanas projektu - DVP".
2. Būvprojekta realizācijas laikā ievērot inženiertīklu aizsargjoslas saskaņā ar MK not. 574, LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un ‚Aizsargjoslu likumu. Aizsargjoslās aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku un triecienmehānismiem, ierīkot mašīnu un mehānismu stāvvietas.
3. Ņemt vērā visu esošo inženierkomunikāciju aizsargjoslas. Rakšanas darbus saskaņot ar inženierkomunikāciju īpašnieku.
4. Būvdarbu laikā bojātie elementi jānomaina.
5. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot esošo segumu būvlaukuma teritorijā;
6. Lai nodrošinātos pret nepiederošo personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši Darba aizsardzības likumam. Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukumā tikai ar aizsargķiveri galvā. Atbildīgais-būvobjekta tiešais vadītājs, apmeklētāji, kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai vadītāja pavadībā. Nepiederošām personām būvlaukumā atrasties stingri aizliegts.
7. Nekādā gadījumā nav pieļaujama iebrauktuvju vienlaicīga norobežošana (lai tiktu nodrošināta NMPD un VUGD transporta piekļuves iespēja ēkām un būvēm iekšpagalmā jebkurā laikā)
8. Pārbaudīt mezglu risinājumu atbilstību situācijai objektā. Konstatēto neatbilstību rezultātā informēt projekta autorus, lai autoruzraudzības kārtībā tos koriģējot.
9. Darbu veikšanas laikā konstrukcijas un materiālus sargāt no lietus un saules iedarbības - lietot sastatnes ar aizsargklājumu un jumtu, lai novērstu izskalojumus vai cita veida lietus/saules iedarbības bojājumus.
10. Būvdarbu veikšanas laikā objektā ievērot kārtību.
11. Būvdarbu laikā netiek pārtraukta ēkas izmantošanas funkcijas.
12. Materiālu nokrautnes svars uz bēniņu grīdas un jumta pārseguma plātnes nedrīkst pārsniegt 100kg/m2.
13. Neveidot materiālu nokrautnes koncentrētās vietās un pārseguma laiduma vidusdaļā;
14. Iebrauktuvēm iekšpagalmā jābūt izbraucamām visā būvdarbu izpildes gaitā (izņemot īslaicīgus ierobežojumus līdz 2h darba dienas ietvaros atsevišķu kraušanas/pacelšanas/darbu laikā). Plānotos iebrauktuves norobežojoumus katrā konkrētajā reizē saskaņojot ar attiecīgo dienestu vadītājiem.
15. Būvnieka privātās automašīnas autostāvvietas tiek saskaņotas ar pasūtītāju.
16. Pirms būvniecības uzsākšanas izvērtēt iepriekš nomainīto elementu saglabāšanu un atkārtotu izmantošanu. Elementu saglabāšanu un atkārtotu izmantošanu saskaņot ar visiem būvniecības dalībniekiem.
17. Izmēri ir doti metros;
18. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt DOP daļas skaidrojošajā aprakstā.
19. Proj. elektrodu zemējumu risinājumus t.sk. šurfējumus skat. EL-T sadaļā

PIEŅEMTIE DOP DAĻAS APZĪMĒJUMI

	Zemes gabala robeža
	Sarkanās līnijas
	Izbūvējams saliekamais būvlaukuma pagaidu nožogojums, h=2.0 m (168 t.m.)
	Būvgružu konteiners 5.5 m³ (1 gab.)
	Būvtāfele ar likumdošanā noteikto informāciju par objektu (1 gab.)
	Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti (1 gab.)
	Būvlaukuma brīdinājuma zīme (1 gab.)
	Biotualete
	Sadzīves atkritumu konteiners
	Ieeja ēkā
	Būvtehnikas kustības virziens būvlaukumā un piebraukšana pie tā
	Vārti transportam (1 gab.)
	Pirmās palīdzības sniegšanas vieta, medicīnas aptieciņa
	Ugunsdzēšamais aparāts
	Atjaunojamā ēka
	Esošā atjaunojamā ēkas apmale
	Projektētais sastatņu izvietojums. Sastatnes 0.2m attālumā no fasādes

BŪVLAUKUMA ELEKROAPGĀDE
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pie esošās ēkas sadalnes. No esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu būvlaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzīves vagoniņa. Posmu no ēkas līdz būvžogam aizsargāt pret mehānsikiem bojājumiem, ievietot čaulā. Veicot pagaidu pieslēgumu pie tīkliem, pieslēguma kārtību, nosacījumus, ierīču jaudu, un lietošanas terminus saskaņot ar pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu elektrības pieslēgumu organizēt caur atsevišķu skaitītāju. Būvlaukuma elektroapgādi ieteicams organizēt caur strāvas noplūdes automātiem.

BŪVLAUKUMA ŪDENSAPGĀDE, PAGAIDU KANALIZĀCIJA
Ūdens pieslēgumu būvniecības vajadzībām veidot pie esošā ievada.
Pieslēgšanās vietu un terminus saskaņot ar pasūtītāju, apsaimniekotāju.
Pagaidu pieslēgumu veidot caur atsevišķu ūdens skaitītāju.
Ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina darbu veicējs uzpildāmos ūdens traukos.
Būvlaukumā uzstādīt Biotualeti.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS SIA "CMB" BŪVK. REĢ. NR. 0598-R	BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	**AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"** **REĢ. NR. 50003182001**		PASŪT./ARHĪVA NR. PD29/12/2023-2
	OBJEKTA NOSAUKUMS	**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ZEIFERTA IELĀ 3, OLAINĒ ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA**		STADIJA **BP**
	OBJEKTA ADRESE KAD. APZ.	**ZEIFERTA IELA 3, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114** **8009 002 0624 001**		FAILA NOS. <Unsaved Drawing>
	RASĒJUMA NOSAUKUMS	**BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS PLĀNS**		MARKA DOP-1 RAS. NR.
	IZSTRĀDĀTĀJI	VĀRDS / UZVĀRDS	PARAKSTS	MĒROGS 1:500
	DAĻAS VAD.	ZANE KOROĻA		DATUMS 31.08.2026
	IZSTRĀDĀJA	A. K. DĀBOLIŅŠ		LAPAS NR. 1 A3
